

Innkjøps prosess	1
Material liste.....	2
Materialliste (øvre del)	5
Materialbestykning per post (midtre del)	5
Materialbestykning per artikkel (nedre del)	7
Status rapport innkjøp	12
Statusrapport innkjøp (øvre del)	13
Statusrapport innkjøp (nedre del)	14
Utarbeidelse av rekvisisjon	17
Utarbeidelse av rekvisisjon (øvre del)	19
Ny rekvisisjon (midtre del)	19
Varelinje (nedre del)	23
Status mine rekvisisjoner	27
Status mine rekvisisjoner (øvre del)	29
Rekvisisjon nummer (midtre del)	30
Varelinje (nedre del)	31
Oppslag rekvisisjoner	34
Oppslag rekvisisjoner (øvre del).....	37
Rekvisisjon nummer (midtre del)	38
Varelinje (nedre del)	39
Godkjenning av rekvisisjon.....	43
Godkjenning av rekvisisjon (øvre del)	46
Detaljer (midtre del)	47

Varelinje (nedre del)	49
Bestilling	53
Bestilling (øvre del)	55
Detaljer (midtre del)	56
Varelinje (nedre del)	60
Ordrebekreftelse fra leverandør	62
Ordrebekreftelse fra leverandør (øvre del)	65
Detaljer (midtre del)	66
Varelinje (nedre del)	67
Oppfølging av ordre	72
Oppfølging av ordre (øvre del)	74
Detaljer (midtre del)	75
Varelinje (nedre del)	76
Fakturakontroll	82
Fakturakontroll (øverste del)	84
Detaljer (midtre del)	85
Varelinje (nedre del)	86
Mottak av varer	87
Mottak av varer (øvre del)	90
Detaljer (midtre del)	91
Varelinjer (nederste del)	92
Scanning av varer med WebApp på mobil	96

Innkjøps prosess

Formålet med innkjøps prosessen er å sikre at materialbehov og innkjøp er harmonisert med produksjonsunderlag og gjeldende leverandøravtaler.

Primært anskaffes alt materiell basert på en Material-liste (rekvisisjon) pr. Jobbpakke, dersom den ikke kjøpes i bulk. Denne aggregeres fra bestykningen av mengden «kalkyleobjekter» som inngår i Jobbpakkens produksjon. Anskaffelsesprosessen initieres ved at det utarbeides en bestilling pr. leverandør som er inkludert i de respektive Jobbpakkers Material-liste. Bestillingstidspunkt varsles ut fra planlagt oppstart av Jobbpakke, ønsket ledetid og kritisk leveringstid for material-listens artikler. Ønsket leveringstidspunkt kalkuleres fra planlagt oppstart av Jobbpakke og ønsket ledetid.

Innkjøps prosess inneholder følgende applikasjoner:

- Material liste
- Status rapport innkjøp
- Utarbeidelse av rekvisisjon
- Status mine rekvisisjoner
- Oppslag rekvisisjoner
- Godkjenning av rekvisisjon
- Bestilling
- Ordrebekreftelse fra leverandør
- Oppfølging av ordre
- Varemottak
- Fakturakontroll

Disse applikasjonen finner man under menyen 'Innkjøp/Logistikk'.

Material liste

Formålet med applikasjonen 'Materialliste' er å presentere bestykning per verdibærende post i øvre del samt bestykning per artikkel i nedre del av skjermbildet. Den er også basis for generering av rekvisisjoner. Videre kan man redigere eksisterende bestynings poster samt legge til nye.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'

Se skjermbildet under.

Materialliste

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Ansvarlig

Jobbpakke

Status

Jobbpakkegruppe

Startdato

Sluttdato

Materialbestykning per post

Post	Beskrivelse	Post enhet	Post antall	Artikkelnr.	Artikkelbeskrivelse	Artikkel enhet	Antall pr. post	Artikkel enh.kost	Enh.kost pr. post	Total antall	Total postkost
*RY902T	Switch Mode 24v	stk	9	116-4550-012.2402E	POWER CABINET STX 24V/2A	stk	1	2 966,40	2 966,40	9	26 697,60
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1351102	KONSOLLKLAMMER 42 FZS	stk	0.35	14,48	5,07	3434.165	49 726,71
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1355606	KHZSP-600 FZS L=3M KABELSTIGE 783159		1	87,15	87,15	9811.9	855 107,08
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1356001	5 FZS TAKFESTE 721101	stk	0.35	18,48	6,47	3434.165	63 463,37
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1356535	22S FZV 8X16 SKRUESATS 1356535	stk	1	4,53	4,53	9811.9	44 447,91

Materialliste per artikkel

Lag rekvisisjon Last ned fil

Artikkelnr.	Enhet	Total antall	Leverander	Budsj.enh.kost	Budsjettert totalkost	Antall rekvirert	Antall bestilt	Antall mottatt	Antall levr.faktur.	EAN	Leveringsdager	Type	Siste enh.kost	Gj.snitt enh.kost	Totalkost levr.faktur.
1353103	Pr. stykk/gang	3 354,00	NITO	12,00	40 248,00	10						B			
1000098	Pr. meter	58 880,00	ONNINEN AS	6,78	399 206,40	500	500								
1000275	Pr. meter	6 746,00	ONNINEN AS	21,31	143 757,26	2950	3200								
1000278	Pr. meter	106 782,00	ONNINEN AS	12,83	1 370 013,06	35000	35100								
1000278	Pr. meter	2 137,95	ONNINEN AS	12,83	27 429,90	35000	35100					B			
1001554 - IKKE BRUK	Pr. meter	15 150,00	ONNINEN AS	0,10	1 515,00	22000	21500								

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Materialliste' inneholder søke opsjoner

- Midtre del 'Materialbestykning per post', viser bestykning per verdibærende post
- Nedre del 'Materialbestykning per artikkel', viser bestykning per artikkel

Materialliste (øvre del)

Materialliste

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6
Produksjon

Ansvarlig

Jobbpakke

Status

Jobbpakkegruppe

Startdato

Sluttdato

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig i denne delen:

- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Ansvarlig (valg fra rullegardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny) viser tilhørende jobbpakker til valgt prosjekt
- Status (valg fra rullegardin meny) jobbpakke status
- Jobbpakkegruppe (valg fra rullegardin meny)
- Startdato (jobbpakke start dato koblet til budsjett)
- Sluttdato (jobbpakke slutt dato koblet til budsjett)

Materialbestykning per post (midtre del)

Denne delen presenterer material bestykning per verdibærende post

Materialbestykning per post

Post	Beskrivelse	Post enhet	Post antall	Artikkelnr.	Artikkelbeskrivelse	Artikkel enhet	Antall pr. post	Artikkel enh.kost	Enh.kost pr. post	Total antall	Total postkost
*RY902T	Switch Mode 24v	stk	9	116-4550-012.2402E	POWER CABINET STX 24V/2A	stk	1	2 966,40	2 966,40	9	26 697,60
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1351102	KONSOLLKLAMMER 42 FZS	stk	0.35	14,48	5,07	3434.165	49 726,71
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1355606	KHZSP-600 FZS L=3M KABELSTIGE 783159		1	87,15	87,15	9811.9	855 107,08
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1356001	5 FZS TAKFESTE 721101	stk	0.35	18,48	6,47	3434.165	63 463,37
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1356535	22S FZV 8X16 SKRUESATS 1356535	stk	1	4,53	4,53	9811.9	44 447,91
CR001T	Kabelstige, b600, rett element	m	9811.9	1356561	24/34 3M FZS PENDELSKINNE 7211	m	0.18	23,84	4,29	1766.142	42 104,83

Følgende informasjon presenteres:

- Verdibærende post
- Beskrivelse
- Post enhet
- Post antall
- Artikkel nummer
- Artikkelbeskrivelse
- Artikkel enhet
- Antall pr. post
- Artikkel enhets kost (hentes fra prislister for prosjektet)
- Enhets kost pr. post
- Totalt antall ([Post Antall] * [Antall pr. Post])
- Total post kost ([Artikkel Enh.kost] * [Total antall])

Ved å trykke på en post aktiveres følgende pop up vindu:

Bestykning av post



Artikkelnr.

Type

Antall

Ny

Artikkelnr.	Antall	Type	
1356535 - 22S FZV 8X16 SKRUESATS 1356535	1,00		Rediger Slett
1351102 - KONSOLLKLAMMER 42 FZS	0,35		Rediger Slett
1356001 - 5 FZS TAKFESTE 721101	0,35		Rediger Slett
1356561 - 24/34 3M FZS PENDELSKINNE 7211	0,18		Rediger Slett
1358600 - SKJ?TELASK 21 CLICK ZM CSU7950	1,00		Rediger Slett
1358676 - 3/600 FZS B?REJERN 721873	0,35		Rediger Slett
Takpendel 2 - Takpendel 2-L=1255(1248.2)FZV	0,10		Rediger Slett
1355606 - KHZSP-600 FZS L=3M KABELSTIGE 783159	1,00		Rediger Slett

Avslutt

Her kan man legge til nye bestykninger samt redigere eksisterende bestykninger.

Materialbestykning per artikkel (nedre del)

Denne delen presenterer material bestykning per artikkel.

Materialliste per artikkel													Lag rekvisisjon		Last ned fil	
Artikkelnr.	Enhet	Total antall	Leverandør	Budsj.enh.kost	Budsjettert totalkost	Antall rekvirert	Antall bestilt	Antall mottatt	Antall levr.faktur.	EAN	Leveringsdager	Type	Siste enh.kost	Gj.snitt enh.kost	Totalkost levr.faktur.	
1353103	Pr. stykk/gang	3 354,00	NITO	12,00	40 248,00	10						B				
1000098	Pr. meter	58 880,00	ONNINEN AS	6,78	399 206,40	500	500									
1000275	Pr. meter	6 746,00	ONNINEN AS	21,31	143 757,26	2950	3200									
1000278	Pr. meter	106 782,00	ONNINEN AS	12,83	1 370 013,06	35000	35100									
1000278	Pr. meter	2 137,95	ONNINEN AS	12,83	27 429,90	35000	35100					B				
1001554 - IKKE BRUK	Pr. meter	15 150,00	ONNINEN AS	0,10	1 515,00	22000	21500									

Følgende informasjon presenteres:

- Artikkel nummer
- Enhet
- Totalt antall
- Leverandør
- Budsjett enhets kost (hentes fra gjeldende budsjett verdibærende post)
- Antall rekvirert (hentes fra alle rekvisisjoner mot angjeldende Jobbpakke)
- Antall bestilt (hentes fra alle bestillinger mot angjeldende Jobbpakke)
- Antall mottatt (hentes fra varemottak på bestillinger for angjeldende Jobbpakke)
- Antall leverandør fakturaer (ikke implementert)
- EAN nummer (European Article Number)
- Leverings dager
- Type ('B' = Bulk artikkel, 'P' = Primær artikkel)
- Siste enhetskost (ikke iverksatt)
- Gjennomsnitt enhets kost (ikke implementert)

- Total kost leverandørs faktura (ikke implementert)

Ved å aktivere funksjonen 'Lag rekvisisisjon' presenteres følgende popup-vindu:

Rekvisisjon

×

Artikkelnr.	Artikkelbeskrivelse	Enhet	Total antall	Antall rekvirert	Denne rekvisisjon
1351102	KONSOLLK LAMMER 42 FZS	Pr. stykk/gang	0.98	3968	1500
1355604	KHZSP-400 FZS L=3M KABELSTIG E 783157		2.8	80	40
1355606	KHZSP-600 FZS L=3M KABELSTIG		2.8	600	300

Ønsket lev.dato

20.06.2025

Bestiller

5991 - NINA SPORILD
MYRAN

Konto

4000 - Innkjøp råvarer
og halvfabrikata

Bestykningstype

P - Primary

B - Bulk

P - Primary

Jobbpakke

E021.411.030 -
Kabelbro

✓ Opprett rekvisisjon

✗ Avslutt

Her presenteres følgende informasjon:

- Artikkel nummer
- Artikkel beskrivelse
- Enhet
- Totalt antall
- Antall rekvirert
- Denne bestilling (editor bart, antall til bestilling for artikkelen)
- Ønsket leverings dato (editor bart)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)
- Konto (valg fra rullegardin meny)
- Bestykningstype (B Bulk, P Primær artikkel)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny)

Ved å aktivere 'Opprett rekvisisjon' skapes en rekvisisjon og applikasjonen 'Utarbeidelse av rekvisisjon' åpnes automatisk.

Funksjonen 'Last ned fil' skaper en excel fil fra denne delen.

Status rapport innkjøp

Formålet med 'Status rapport innkjøp' er å presentere innkjøps status for de enkelte jobbpakkene i et prosjekt.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'.

Statusrapport innkjøp

Prosjekt

150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon

Jobbpakke

Jobbpakke

Rekvirent

Rekvirent

Bestiller

Bestiller

Leverandør

Leverandør

☐ Ferdig bestilt
☐ Ferdig levert
☐ Bestilling ikke bekreftet

Statusrapport innkjøp Last ned fil

Prosjektnr	Jobbpakke nr	Navn	Material budsjett	Rekvisisjonsnr	Bestillingnr	Symbrio	Leverandør	Bestilt dato	Ønsket lev. dato	Pris på bestilling	Ordrebekreftet dato	Bekreftet lev.dato	Varemottak komplett dato	Faktura mottak dato
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00001	B-150050-00001	N	70000 - ONNINEN AS	07.06.2023	07.06.2023	99,19	08.06.2023	07.06.2023		
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00002	B-150050-00003	N	70001 - Ahlsell AS	15.06.2023	16.06.2023	24,70	16.06.2023	19.06.2023		
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00003	B-150050-00002	N	70000 - ONNINEN AS	15.06.2023	16.06.2023	233,28	16.06.2023	16.06.2023		
150050	KL51N.41x.001	Rør i fasaden 5.1N	66,00	R-150050-00004	B-150050-00004	N	70000 - ONNINEN AS	19.06.2023	20.06.2023	489,94	20.06.2023	20.06.2023		
150050	KL41N.41x.001	Rør i fasaden 4.1N	56,00	R-150050-00005	B-150050-00005	N	70000 - ONNINEN AS	22.06.2023	22.06.2023	45,69	23.06.2023	23.06.2023		
150050	KL51N.41x.001	Rør i fasaden 5.1N	66,00	R-150050-00006	B-150050-00006	N	70000 - ONNINEN AS	22.06.2023	22.06.2023	2,56	23.06.2023	22.06.2023		
150050	KL41N.41x.001	Rør i fasaden 4.1N	56,00	R-150050-00007	B-150050-00007	N	70000 - ONNINEN AS	03.08.2023	04.08.2023	233,45	04.08.2023	04.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00009	B-150050-00008	N	70000 - ONNINEN AS	14.08.2023	15.08.2023	451,97	15.08.2023	15.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00010	B-150050-00009	N	70000 - ONNINEN AS	22.08.2023	23.08.2023	354,09	23.08.2023	23.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00011	B-150050-00010	N	70001 - Ahlsell AS	23.08.2023	24.08.2023	44,35	24.08.2023	24.08.2023		
150050	52TN.41x.001	Rør gjennom tak 5.2(T) N	12,00	R-150050-00012	B-150050-00011	N	70000 - ONNINEN AS	01.09.2023	04.09.2023	151,45	02.09.2023	04.09.2023		
150050	KL41N.41x.002	Rør i Kald lysgård 4.1 KL (N)	38,00	R-150050-00013	B-150050-00012	N	70000 - ONNINEN AS	01.09.2023	04.09.2023	16,98	02.09.2023	04.09.2023		
150050	61N.411.001	Røranlegg utvendig himling	200,00	R-150050-00014	B-150050-00013	N	70000 - ONNINEN AS	08.11.2023	09.11.2023	0,00	09.11.2023	09.11.2023		

Denne har følgende 2 seksjoner:

- Øvre del 'Statusrapport innkjøp' inneholder søke opsjoner
- Nedre del 'Statusrapport innkjøp' viser innkjøps detaljer

Statusrapport innkjøp (øvre del)

Statusrapport innkjøp			
Prosjekt	Jobbpakke	Rekvirent	Bestiller
150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon	Jobbpakke	Rekvirent	Bestiller
Leverandør	☐ Ferdig bestilt ☐ Ferdig levert ☐ Bestilling ikke bekreftet		
Leverandør			

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig i denne delen:

- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny) viser tilhørende jobbpakker til valgt prosjekt
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)
- Leverandør (valg fra rullegardin meny)
- Ferdig bestilt (avkrysnings boks)
- Ferdig levert (avkrysnings boks)
- Bestilling ikke bekreftet (avkrysnings boks)

Statusrapport innkjøp (nedre del)

Statusrapport innkjøp														Last ned fil
Prosjektnr	Jobbpakke nr	Navn	Material budsjett	Revisjonsnr	Bestillingsnr	Symbrio	Leverandør	Bestilt dato	Ønsket lev. dato	Pris på bestilling	Ordrebekreftet dato	Bekreftet lev.dato	Varemottak komplett dato	Faktura mottak dato
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00001	B-150050-00001	N	70000 - ONNINEN AS	07.06.2023	07.06.2023	99,19	08.06.2023	07.06.2023		
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00002	B-150050-00003	N	70001 - Ahlsell AS	15.06.2023	16.06.2023	24,70	16.06.2023	19.06.2023		
150050	KL61N.41x.001	Rør i fasaden 6.1N	84,00	R-150050-00003	B-150050-00002	N	70000 - ONNINEN AS	15.06.2023	16.06.2023	233,28	16.06.2023	16.06.2023		
150050	KL51N.41x.001	Rør i fasaden 5.1N	66,00	R-150050-00004	B-150050-00004	N	70000 - ONNINEN AS	19.06.2023	20.06.2023	489,94	20.06.2023	20.06.2023		
150050	KL41N.41x.001	Rør i fasaden 4.1N	56,00	R-150050-00005	B-150050-00005	N	70000 - ONNINEN AS	22.06.2023	22.06.2023	45,69	23.06.2023	23.06.2023		
150050	KL51N.41x.001	Rør i fasaden 5.1N	66,00	R-150050-00006	B-150050-00006	N	70000 - ONNINEN AS	22.06.2023	22.06.2023	2,56	23.06.2023	22.06.2023		
150050	KL41N.41x.001	Rør i fasaden 4.1N	56,00	R-150050-00007	B-150050-00007	N	70000 - ONNINEN AS	03.08.2023	04.08.2023	233,45	04.08.2023	04.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00009	B-150050-00008	N	70000 - ONNINEN AS	14.08.2023	15.08.2023	451,97	15.08.2023	15.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00010	B-150050-00009	N	70000 - ONNINEN AS	22.08.2023	23.08.2023	354,09	23.08.2023	23.08.2023		
150050	42TN.41x.001	Rør gjennom tak 4.2(T) N	12,00	R-150050-00011	B-150050-00010	N	70001 - Ahlsell AS	23.08.2023	24.08.2023	44,35	24.08.2023	24.08.2023		

Følgende informasjon presenteres i denne delen:

- Prosjekt nummer
- Jobbpakke nummer
- Navn
- Material budsjett
- Revisjons nummer
- Bestillings nummer
- Symbrio indikator (elektronisk bestilling via Symbrio 'J/N')
- Leverandør
- Bestilt dato (dato ved 'Opprett bestilling' i 'Bestillings' bildet)
- Ønsket leverings dato
- Pris på bestilling
- Ordrebekreftet dato (ordre bekreftelses dato fra leverandør eller bekreftelse fra Symbrio)

- Bekreftet leverings dato
- Varemottak komplett dato (Dato når siste varelinjen er mottatt i en bestilling/rekvisisjon)
- Faktura mottak dato (Godkjent faktura dato)

Funksjonen 'last ned fil' skaper en 'excel' fil rapport.

Utarbeidelse av rekvisisjon

Formålet med applikasjonen 'Utarbeidelse av rekvisisjon' er skape nye rekvisisjoner som anvendes til varekjøp. En rekvisisjon er «behovsorientert» og utarbeides av den som har materialbehovet.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Se skjermbildet under.

Utarbeidelse av rekvisisjon

Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn	Beløp	Rekv.dato
R-150002-00014	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0	22.05.2025
R-150002-00015	NINA SPORILD MYRAN	Uttak til infoskjermer prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0	22.05.2025
R-150002-00016	NINA SPORILD MYRAN		4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0	23.05.2025
R-150002-00017	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0	27.05.2025

Ny rekvisisjon

Prosjekt		Belastningsted		Jobbpakke		Åpne rekvisisjon
150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg		Enkel jobbpakke		GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor		
Rekvirent		Budsjettansvarlig		Bestiller		
5991 - NINA SPORILD MYRAN		5996 - CHRISTIAN MO		5991 - NINA SPORILD MYRAN		
Betalingsform	Konto	Ønsket lev. dato		Forslag		
2 - Regningsarbeid	4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata					

Åpne rekvisisjon

[illegible][illegible]

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Utarbeidelse av rekvisisjon' viser eksisterende rekvisisjoner
- Midtre del 'Ny rekvisisjon' brukes til å lage en ny rekvisisjon samt editering av en eksisterende rekvisisjon
- Nedre del 'Varelinje' anvendes til å skape nye varelinjer til en valgt rekvisisjon samt editere eksisterende varelinjer

Utarbeidelse av rekvisisjon (øvre del)

Utarbeidelse av rekvisisjon						
Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn	Beløp	Rekv.dato
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0	21.05.2025
R-170003-00130	KRISTOFFER HEIAN	Rørføringer i vegg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 8 775	06.11.2020
R-170003-00142	KRISTOFFER HEIAN	Rørføringer i vegg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 3 752	19.11.2020
R-170003-00147	KRISTOFFER HEIAN	Rørføringer Fasade Sone 4	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 1 584	23.11.2020

Følgende overordnet informasjon av rekvisisjonen presenteres:

- Rekvisisjons nummer
- Rekvirent
- Jobbpakke
- Konto nummer
- Kontonavn
- Beløp
- Rekvisisjons dato

Ved aktivering av en eksisterende 'Rekvisisjons' rad presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Ny rekvisisjon' og 'Varelinje' seksjonene.

Ny rekvisisjon (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å lage en ny rekvisisjon eller visning av en eksisterende rekvisisjon.

Ny rekvisisjon

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Belastningssted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Ønsket lev. dato

30.05.2025

Forslag

Opprett rekvisisjon

Fyll ut alle felt og legg til minst en varelinje for å sende rekvisisjon.

Varelinje

Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Beskrivelse	Denne bestilling	Ønsket lever. dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103 - L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	L-AVGRENING 200MM H	20	30.05.							+

Ny rekvisisjon skapes ved taste inn følgende data:

- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Belastningssted (valg fra rullegardin meny) - Inneholder 'Budsjettansvarlig', 'Enkel jobbpakke' eller 'Prosjektansvarlig'
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny). - Kun tilgjengelig når man velger 'Enkel jobbpakke' under 'Belastningssted'

- Rekvirent - Systemet anvender pålogget bruker som ikke kan endres
- Budsjettansvarlig (valg fra rullegardin meny) – Ved valg av jobbpakke låses feltet til budsjett ansvarlig
- Bestiller (valg fra rullegardin meny). Bestiller kopieres fra 'Rekvirent' og kan endres
- Betalingsform (valg fra rullegardin meny)
- Konto (valg fra rullegardin meny)
- Ønsket leveringsdato

Man må også legge til minst en varelinje og deretter aktivere  ikonet til høyre nederst i 'Varelinje' seksjonen.

Ny rekvisisjon

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg ▼

Belastningssted

Enkel jobbpakke ▼

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor ▼

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO ▼

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Betalingsform

2 - Regningsarbeid ▼

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼

Ønsket lev. dato

30.05.2025

Forslag

Opprett rekvisisjon

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Beskrivelse	Denne bestilling	Ønsket lever. dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	20	30.05.2025					Kr	Kr	Rediger Slett
2			00174	Plastkjetting Ø7,5 mm rød/hvit	30	30.05.2025					Kr	Kr	Rediger Slett
3	▼	▼	▼			30.05.20							+

Deretter kan man aktivere funksjonen 'Opprett rekvisisjon' som lager en ny rekvisisjon. Følgende melding presenteres:

SUKSESS!

Rekvisisjonen ble
sendt.



Rekvisisjonen er nå klar til å godkjennes i applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon'.

Den 'nye' rekvisisjonen kan nå hentes fram igjen ved 'klikke' på den i 'Øverste del'. Deretter kan man aktivere funksjonen 'Åpne rekvisisjon' og den er nå tilgjengelig for redigering igjen. Se skjermbildet under.

Ny rekvisisjon

Prosjekt 150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg	Belastningsted Enkel jobbpakke	Jobbpakke GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor	Lagre rekvisisjon Send rekvisisjon Slett rekvisisjon
Rekvirent 5991 - NINA SPORILD MYRAN	Budsjettansvarlig 5996 - CHRISTIAN MO	Bestiller 5996 - CHRISTIAN MO	
Betalingsform 1 - Fastpris	Konto 4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Ønsket lev. dato 05.11.2025	

Forslag

Ved å aktivere **Slett rekvisisjon** kan man slette rekvisisjonen. Det er kun Rekvirent som kan slette rekvisisjonen før den er sendt til godkjenning. Budsjettansvarlig kan slette dersom den er sendt til godkjenning.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å skape nye varelinjer samt korrigere eller slette eksisterende varelinjer (se skjermbildet under).

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Beskrivelse	Denne bestilling	Ønsket lever. dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	20	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
2			0730606	Patchkabel Kat6a 3m	30	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
3	▼	▼	▼										+

‘Varelinje’ seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan editeres ved registrering av ny varelinje (eksisterende varelinje kan kun endres via ‘Rediger’ funksjon):

- Varelinje nummer - Ikke editer bart
- Bok (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)
- Beskrivelse fremkommer automatisk fra valgt artikkel - Ikke editer bart
- Denne bestilling (antall)
- Ønsket leverings dato
- Hittil bestilt - Ikke editer bart
- Gjeldende budsjett - Ikke editer bart
- Hittil levert - Ikke editer bart
- Hittil produsert - Ikke editer bart
- Enhetskost - Ikke editer bart
- Enhetspris - Ikke editer bart

Lagring av varelinje skjer når man trykker på ikonet  som skaper en tom varelinje under.

Ved aktivering av 'Redigering' knapp helt til høyre i varelinje seksjon aktiveres følgende editerings popup-vindu:

Rediger varelinje

Varelinje

1

Bok

1

Verdibær. post

1.3.2

Leverandørs artikkelnr.

1353103

Denne bestilling

100

Ønsket levert dato

29.09.2022

Beskrivelse

L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V

Hittil bestilt

0

Gjeldende budsjett

0

Hittil levert

0

Hittil produsert

33

Enh. kost

123

Enh. pris

✓ Lagre

✗ Avbryt

Her kan man editere følgende data:

- Bok (valg fra rullegardin meny)
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny)

- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)
- Denne bestilling - Antall som skal bestilles.
- Ønsket levert dato
- Beskrivelse av leverandørs artikkel nummer

Følgende kan ikke endres og er kun ment til visning:

- Hittil bestilt
- Gjeldene budsjett
- Hittil levert
- Enhets kost
- Enhets pris

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' opsjon (popup-vindu). Hvor man kan bekrefte sletting av varelinjen.

Bekreftelse

Er du sikker på at du ønsker å slette denne varelinjen?

✓ Bekreft

✖ Avbryt

Status mine rekvisisjoner

Formålet med applikasjonen 'Status mine rekvisisjoner' er at rekvirent kan å følge opp status på sine rekvisisjoner.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'

Ved åpning av applikasjonen vises rekvisisjoner som er skapt av pålogget bruker. Se skjermbildet under.

Status mine rekvisisjoner

Ferdig bestilt

Ferdig levert

Hovedprosjekt

Prosjekt

Jobbpakke

R-nr

Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.	Beløp	Rekv.dato
R-150002-00031	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	02.11.2025
R-150009-00002	Jannicke Knudsen	2 - Serverrom	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	10.05.2023
R-150030-00006	NINA SPORILD MYRAN	Drift av rigg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	25.01.2024
R-150030-00065	Jannicke Knudsen	Drift av rigg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	22.10.2024

Rekvisisjon R-150002-00031

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Revisjon

Lagre rekvisisjon

Send rekvisisjon

Slett rekvisisjon

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5996 - CHRISTIAN MO

Betalingsform

1 - Fastpris

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Varelinje

Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	20	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	05.11.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
2			00111	30	Trafikksylinder 942 m/ gummifot	05.11.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
3													+

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del ‘Status mine rekvisisjoner’ inneholder søke opsjoner samt overordnet visning av eksisterende rekvisisjoner
- Midtre del ‘Rekvisisjon nummer’ presenterer en valgt rekvisisjon fra ‘Øverste del’
- Nedre del ‘Varelinje’ viser de enkelte varelinjene til en valgt rekvisisjon

Ved å aktivere en eksisterende 'Rekvisisjons' rad presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Rekvisisjon nummer' seksjonen og tilhørende varelinjer i 'Varelinje seksjonen'.

Status mine rekvisisjoner (øvre del)

Status mine rekvisisjoner

Ferdig bestilt

Ferdig levert

Hovedprosjekt

▼

Prosjekt

▼

Jobbpakke

▼

Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.	Beløp	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr0,00	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr0,00	21.05.2025
R-150009-00002	Jannicke Knudsen	2 - Serverrom	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr0,00	10.05.2023
R-150030-00006	NINA SPORILD MYRAN	Drift av rigg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr0,00	25.01.2024

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Ferdig bestilt (avkrysnings boks)
- Ferdig levert (avkrysnings boks)
- Hovedprosjekt (valg fra rullegardin meny) – Ved valg av hovedprosjekt vises tilhørende prosjekter i 'Prosjekt'
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny)

Følgende data presenteres:

- Rekvisisjons nummer
- Rekvirent
- Jobbpakke
- Konto nummer

- Kontonavn
- Beløp
- Rekvisisjons dato

Rekvisisjon nummer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å presentasjon og endring av en eksisterende rekvisisjon.

Rekvisisjon R-150002-00019

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg ▼

Belastningsted

Enkel jobbpakke ▼

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor ▼

Ikke godkjent

Lagre rekvisisjon

Rekvirent

-1 - Admin ▼

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO ▼

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Betalingsform

3 - Mengdebasert ▼

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼

Åpne rekvisisjon

Slett rekvisisjon

Ved å aktivere funksjonen 'Åpne rekvisisjon' kan man editere noen av feltene:

- Prosjekt - Kan ikke endres
- Belastningssted - Valg fra rullegardin meny som inneholder: 'Budsjettansvarlig', 'Enkel jobbpakke' eller 'Prosjektansvarlig'
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny) - Denne aktiveres kun når man velger 'Enkel jobbpakke' under 'Belastningssted'
- Rekvirent - Kan ikke endres
- Budsjettansvarlig (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller - Kan ikke endres
- Betalingsform (valg fra rullegardin meny)
- Konto (valg fra rullegardin meny)

Endringer lagres ved å aktivere 'Lagre rekvisisjon' funksjonen og deretter endres teksten fra 'Åpne rekvisisjon' til 'Send rekvisisjon'.

Ved å aktivere 'Send rekvisisjon', er rekvisisjonen klar for godkjenning i applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon'.

Funksjonen 'Slett rekvisisjon' kan utføres av følgende:

- Rekurrent kan slette rekvisisjon dersom den ikke er sendt til godkjenning
- Budsjettansvarlig kan å slette rekvisisjon dersom den er sendt til godkjenning

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å skape nye varelinjer samt korrigere eller slette eksisterende varelinjer (se skjermbildet under).

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	20	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
2			0730606	30	Patchkabel Kat6a 3m	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
3	▼	▼	▼										+

'Varelinje' seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan editeres ved registrering av ny varelinje (eksisterende varelinje kan kun endres via 'Rediger' funksjon):

- Varelinje nummer - Ikke editert
- Bok (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Leverandørs artikkel nummer (rullegardin meny)

- Beskrivelse fremkommer automatisk fra valgt artikkel - Ikke editer bart
- Denne bestilling (antall)
- Ønsket leverings dato
- Hittil bestilt - Ikke editer bart
- Gjeldende budsjett - Ikke editer bart
- Hittil levert - Ikke editer bart
- Hittil produsert - Ikke editer bart
- Enhetskost - Ikke editer bart
- Enhetspris - Ikke editer bart

Lagring av varelinjer skjer når man trykker på ikonet  som også skaper en tom varelinje under.

Ved aktivering av funksjonen 'Redigering' knapp helt til høyre i varelinje seksjon aktiveres følgende editerings pop up vindu:

Rediger varelinje ✕

Ordrelinje	Bok	Post	Leverandørs artikkelnr		
1	▼	▼	01148-001 ▼		
Denne bestilling	Ønsket lever. dato				
10	30.05.2025				
Beskrivelse					
AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender					
Hittil bestilt	Gjeldende busjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris
0	0	0	0		

✓ Lagre ✕ Avbryt

Her kan man editere følgende data:

- Bok (rullegardin meny). Kan utelates
- Verdibærende post (rullegardin meny boks). Kan utelates
- Leverandørs artikkel nummer (rullegardin meny)

- Denne bestilling. Antall som skal bestilles.
- Ønsket levert dato
- Beskrivelse av leverandørs artikkel nummer

Følgende kan ikke endres og er kun ment til visning:

- Hittil bestilt
- Gjeldene budsjett
- Hittil levert
- Hittil produsert
- Enhets kost
- Enhets pris

Ved aktivering av funksjonen 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'Bekreftelses' popup-vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av varelinjen.

Bekreftelse

Er du sikker på at du ønsker å slette denne varelinjen?

✓ Bekreft

✖ Avbryt

Oppslag rekvisisjoner

Formålet med applikasjonen 'Oppslag rekvisisjoner' er å følge opp status på rekvisisjonene samt modifisering av disse ved behov.

Denne applikasjonen finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'

Se skjermbildet under.

Oppslag rekvisisjoner

☐ Ferdig bestilt ☐ Ferdig levert ☐ Godkjent☐ Mine

Hovedprosjekt ▼

Prosjekt ▼

Jobbpakke ▼

Rekvirent ▼

Bestiller ▼

Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.		Beløp	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	21.05.2025
R-150002-00014	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	22.05.2025
R-150002-00015	NINA SPORILD MYRAN	Uttak til infoskjermer prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	22.05.2025

Rekvisisjon R-150002-00013

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401,
Regningsarbeider Statsbyg ▼

Belastningsted

Enkel jobbpakke ▼

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon
prosjektkontor ▼

Godkjent

Lagre rekvisisjon

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO ▼

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN ▼

Betalingsform

1 - Fastpris ▼

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og
halvfabrikata ▼

Varelinje

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Oppslag rekvisisjoner' inneholder søke opsjoner samt overordnet visning av eksisterende rekvisisjoner
- Midtre del 'Rekvisisjon nummer' presenterer en valgt rekvisisjon fra 'Øverste del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til en valgt rekvisisjon

Oppslag rekvisisjoner (øvre del)

Denne seksjonen inneholder søke opsjoner og overordnet detaljer av rekvisisjonene.

Oppslag rekvisisjoner							
☐ Ferdig bestilt ☐ Ferdig levert ☐ Godkjent ☐ Mine							
Hovedprosjekt ▼ Prosjekt ▼ Jobbpakke ▼ Rekvirent ▼ Bestiller ▼							
Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.		Beløp	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	21.05.2025
R-150002-00014	NINA SPORILD MYRAN	Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	22.05.2025
R-150002-00015	NINA SPORILD MYRAN	Uttak til infoskjermer prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr	0,00	22.05.2025

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Ferdig bestilt (avkrysnings boks)
- Ferdig levert (avkrysnings boks)
- Godkjent (avkrysnings boks)

- Mine (avkrysnings boks). Viser alle rekvisisjoner hvor 'logon' er bestiller i rekvisisjonen eller prosjektleder i prosjekt eller ansvarlig i jobbpakke eller rekvirent i rekvisisjonen
- Hovedprosjekt (valg fra rullegardin meny), ved valg av hovedprosjekt vises tilhørende prosjekter i 'Prosjekt rullegardin meny'.
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny)
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)

Følgende informasjon presenteres:

- Rekvisisjons nummer
- Rekvirent
- Jobbpakke
- Konto nummer
- Kontonavn
- Beløp
- Rekvisisjons dato

Ved aktivering av en eksisterende 'Rekvisisjons' rad presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Revisjon nummer' og 'Varelinje' seksjonene.

Rekvisisjon nummer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å presentasjon og endring av en eksisterende rekvisisjon.

Rekvisisjon R-150002-00016

Prosjekt	Belastningssted	Jobbpakke	Revisjon	Lagre rekvisisjon
150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg	Enkel jobbpakke			Send rekvisisjon
Rekvirent	Budsjettansvarlig	Bestiller		
5991 - NINA SPORILD MYRAN	5991 - NINA SPORILD MYRAN	5991 - NINA SPORILD MYRAN		
Betalingsform	Konto			
2 - Regningsarbeid	4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata			

Her kan man editere noen av følgende felter:

- Prosjekt - Kan ikke endres
- Belastningssted (valg fra rullegardin meny) - Inneholder: 'Budsjettansvarlig, 'Enkel jobbpakke' eller 'Prosjektansvarlig')
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny) - Vises kun når man velger 'Enkel jobbpakke' under 'Belastningssted'
- Rekvirent - Kan ikke endres
- Budsjettansvarlig (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller - Kan ikke endres
- Betalingsform (valg fra rullegardin meny)
- Konto (valg fra rullegardin meny)

Endringer lagres ved å aktivere 'Lagre rekvisisjon' funksjonen.

Ved å aktivere 'Send rekvisisjon' er rekvisisjonen klar for godkjenning i applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon'.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å skape nye varelinjer, korrigere eksisterende varelinjer eller slette varelinjer. (se skjermbildet under)

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	20	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
2			1353103	30	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
3	▼	▼	▼										+

'Varelinje' seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan editeres ved ny varelinje (eksisterende varelinje kan kun endres via 'Rediger' funksjon):

- Varelinje nummer - Ikke editert
- Bok (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)
- Beskrivelse fremkommer automatisk fra valgt artikkel - Ikke editert
- Denne bestilling (antall)
- Ønsket leverings dato
- Hittil bestilt - Ikke editert
- Gjeldende budsjett - Ikke editert
- Hittil levert - Ikke editert
- Hittil produsert - Ikke editert
- Enhetskost - Ikke editert

- Enhetspris - Ikke editer bart

Lagring av varelinjer skjer når man trykker på ikonet  som også skaper en tom varelinje under.

Ved aktivering av 'Redigering' knapp helt til høyre i varelinje seksjon aktiveres følgende editerings pop up vindu:

Rediger varelinje ×

Ordrelinje	Bok	Post	Leverandørs artikkelnr		
1	▼	▼	01148-001 ▼		
Denne bestilling	Ønsket lever. dato				
10	30.05.2025				
Beskrivelse					
AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender					
Hittil bestilt	Gjeldende busjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris
0	0	0	0		

✓ Lagre ✕ Avbryt

Her kan man editere følgende data:

- Bok (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny boks) - Kan utelates
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)

- Denne bestilling - Antall som skal bestilles.
- Ønsket levert dato
- Beskrivelse av leverandørs artikkel nummer

Følgende kan ikke endres og er kun ment til visning:

- Hittil bestilt
- Gjeldene budsjett
- Hittil levert
- Hittil produsert
- Enhets kost
- Enhets pris

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' pop up vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av varelinjen.

Bekreftelse

Er du sikker på at du ønsker å slette denne varelinjen?

✓ Bekreft

✖ Avbryt

Godkjenning av rekvisisjon

Formålet med applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon' er å godkjenne rekvisisjoner slik at de er klar for bestilling av varer.

Ved godkjenning skal bestiller angis, slik at rekvisisjonen framkommer på dennes skjermbilde for bestilling. Bestilling av varer utføres i applikasjonen 'Bestilling'.

Applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Se skjermbildet under:

Godkjenning av rekvisisjon							
		Hovedprosjekt	Prosjekt		Rekvisisjonsnr.		
Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn	Beløp	Ønsk.levdato	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	00.00.001 Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.001 Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	29.05.2025	21.05.2025
R-150002-00014	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.001 Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	22.05.2025

Prosjekt

Rekvisisjonsnr.

Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn	Beløp	Ønsk.levdato	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	00.00.001 Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.001 Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	29.05.2025	21.05.2025
R-150002-00014	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.001 Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	22.05.2025

Detaljer

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Rekv.nr.

R-150002-00014

Lagre rekvisisjon

Godkjenn

Slett rekvisisjon

Belastningsted

Lagre rekvisisjon

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon
prosjektkontor

Budsjettansvarlig

Godkjenn

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Konto

Slett rekvisisjon

R-150002-00014

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	

Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris
-----------	-----	-------------------	-------------------------	------------------	-------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------	------------------	-----------	-----------

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Godkjenning av rekvisisjon' viser eksisterende rekvisisjoner samt tilhørende søke opsjoner
- Midtre del 'Detaljer' presenterer innholdet av en valgt rekvisisjon fra 'Øvre del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til valgt rekvisisjon

Ved aktivering av en eksisterende 'Rekvisisjons' rad presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Detaljer' og 'Varelinje' seksjonene.

Godkjenning av rekvisisjon (øvre del)

Godkjenning av rekvisisjon							
				Hovedprosjekt	Rekvisisjonsnr.		
Rekvisisjonsnr.	Rekvirent	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn	Beløp	Ønsk.levdato	Rekv.dato
R-150002-00012	NINA SPORILD MYRAN	00.00.001 Standard	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	20.05.2025
R-150002-00013	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.001 Kabling til resepsjon prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	29.05.2025	21.05.2025
R-150002-00015	NINA SPORILD MYRAN	GK401.1R.002 Uttak til infoskjermer prosjektkontor	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	30.05.2025	22.05.2025

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Hoved prosjekt (valg fra rullegardin meny)

- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- rullegardin meny boks hvor man kan velge mellom 'Rekvisjonsnr.', Jobbpakke' og 'Ønsket leveringsdato' for sortering av rekvisisjonene.

Følgende data presenteres:

- Rekvisisjons nummer
- Rekvirent
- Jobbpakke
- Konto nummer
- Kontonavn
- Beløp
- Ønsket leverings dato
- Rekvisisjons dato

Detaljer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å presentasjon og endring av en eksisterende rekvisisjon. Se skjermbildet under.

Detaljer

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Betalingsform

1 - Fastpris

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Bestiller

5996 - CHRISTIAN MO

Rekv.nr.

R-150002-00031

Lagre rekvisisjon

Godkjenn

Slett rekvisisjon

Her kan man editere noen av følgende felter:

- Prosjekt - Kan ikke endres
- Belastningssted - Kan ikke endres
- Jobbpakke- Kan ikke endres
- Rekvirent- kan ikke endres
- Budsjettansvarlig - Kan ikke endres
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)
- Betalingsform (valg fra rullegardin meny)
- Konto (valg fra rullegardin meny)

Rekvisisjons endringer lagres ved å aktivere 'Lagre rekvisisjon'.

Ved å aktivere 'Godkjenn' funksjonen, endres status slik at rekvisisjonen er klar for bestilling i 'Bestillings' applikasjonen. Teksten 'Godkjent' introduseres samt at funksjonene 'Godkjenn' og 'Slett rekvisisjon' fjernes fra skjermbildet.

Ved aktivering av 'Slett rekvisisjon' funksjonen, slettes rekvisisjonen. Der er kun Budsjettansvarlig som kan slette rekvisisjonen.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å skape nye varelinjer, korrigere eksisterende varelinjer eller slette varelinjer. (se skjermbildet under)

Varelinje													
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Beskrivelse	Ønsket levert dato	Hittil bestilt	Gjeldende budsjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris	
1			1353103	20	L-AVGRENING 200MM HVIT MP-447 V	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
2			0730606	30	Patchkabel Kat6a 3m	30.05.2025	0	0,00	0	0	Kr 0,00	Kr 0,00	Rediger Slett
3	▼	▼	▼										+

‘Varelinje’ seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan editeres ved ny varelinje (eksisterende varelinje kan kun endres via ‘Rediger’ funksjon):

- Varelinje nummer – Ikke editert
- Bok (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny) - Kan utelates.
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)
- Beskrivelse fremkommer automatisk fra valgt artikkel - Ikke editert
- Denne bestilling (antall)
- Ønsket leverings dato
- Hittil bestilt - Ikke editert
- Gjeldende budsjett - Ikke editert
- Hittil levert - Ikke editert
- Hittil produsert - Ikke editert
- Enhetskost - Ikke editert
- Enhetspris - Ikke editert

Lagring av varelinjer skjer når man trykker på ikonet  som også skaper en tom varelinje under.

Ved aktivering av 'Redigering' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende editerings pop up vindu:

Rediger varelinje ✕

Ordrelinje	Bok	Post	Leverandørs artikkelnr		
1	▼	▼	01148-001 ▼		
Denne bestilling	Ønsket lever. dato				
10	30.05.2025				
Beskrivelse					
AXIS T8129-E Outdoor PoE Extender					
Hittil bestilt	Gjeldende busjett	Hittil levert	Hittil produsert	Enh. kost	Enh. pris
0	0	0	0		

✓ Lagre ✕ Avbryt

Her kan man editere følgende data:

- Bok (valg fra rullegardin meny)
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny)
- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny)

- Denne bestilling - Antall som skal bestilles
- Ønsket levert dato
- Beskrivelse av leverandørs artikkel nummer

Følgende kan ikke endres og er kun ment til visning:

- Hittil bestilt
- Gjeldene budsjett
- Hittil levert
- Enhets kost
- Enhets pris

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' pop up vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av varelinjen.

Bekreftelse

Er du sikker på at du ønsker å slette denne varelinjen?

✓ Bekreft

✖ Avbryt

Bestilling

Formålet med applikasjonen 'Bestilling' er å sende en ordre bestilling av varekjøp til en leverandør. Bestilling utføres enten ved hjelp av manuell eller elektronisk ordre bestilling.

Applikasjonen 'Bestilling' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Ved åpning av applikasjonen presenteres de rekvisisjoner som angår den påloggede bestiller.

Se skjermbildet under.

Bestilling ■ Vis mine Hovedprosjekt Prosjekt R-nr Rekvisisjonsnr.							
Rekvisisjonsnr.	Budsjettansvarlig	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.	Beløp	Ønsk.lev dato	Rekv.dato
R-150002-00001	CHRISTIAN MO	K1.40x.001 Installasjoner i Område 1	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	08.07.2019	03.07.2019
R-150002-00003	KNUT ANDERSEN	PR15.414.020 Kanal på vegg	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	29.10.2021	12.10.2021
R-150002-00004	GLENN JANSEN	PR15.43x.010 Kabeltrekking EL	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	22.10.2021	12.10.2021

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Godkjent

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5996 - CHRISTIAN MO

Leverandør

Betalingsform

1 - Fastpris

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Rekv.nr.

R-150002-00031

Avtale

Lev.Adresse

Ønsket levert dato

Lagre bestilling

Opprett bestilling

Fjern godkjenning

Slett rekvisisjon

Varelinje												Rapport
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Ønsket levert dato	Leverandør	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Avtalt enh. kost	Enh. pris	Avtalt leveringsdato	
1	▼	▼	1353103 ▼	20	05.11.20	▼	1353103	L-AVGRENING 200MM F		0,00		Bestil Slett
2	▼	▼	00111 ▼	30	05.11.20	▼	00111	Trafikksylinder 942 m/ gu		0,00		Bestil Slett

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Bestilling' viser eksisterende rekvisisjoner samt tilhørende søke opsjoner
- Midtre del 'detaljer' presenterer overordnet detaljer av en valgt rekvisisjon fra 'Øvre del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til en valgt rekvisisjon

Bestilling (øvre del)

Bestilling							
Hovedprosjekt ▼		Prosjekt ▼		☒ Vis mine		Rekvisisjonsnr. ▼	
Rekvisisjonsnr.	Budsjettansvarlig	Jobbpakke	Kontonr.	Kontonavn.	Beløp	Ønsk.lev dato	Rekv.dato
R-170002-00002	NINA SPORILD MYRAN	RLD.INK.001 Innkjøp og Logistikk	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Kr 0,00	12.10.2021	11.10.2021

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Hoved prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Vis mine - (avkrysnings boks) Viser rekvisisjoner som er skapt av påloggings bruker
- Helt til høyre 3 opsjoner i rullegardin meny boks, hvor man kan velge mellom 'Rekvisisjonsnr.', 'Jobbpakke' og 'Ønsket leveringsdato' for sortering av rekvisisjonene.

Følgende data presenteres:

- Rekvisisjons nummer
- Budsjettansvarlig
- Jobbpakke
- Konto nummer
- Kontonavn
- Beløp

- Ønsket leverings dato
- Rekvisisjons dato

Detaljer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til presentasjon og endring av en eksisterende rekvisisjon. Skjermbildet under viser informasjon for en manuell bestilling.

Detaljer					
Prosjekt 150060 - LVB Gjennomføring - Felt 7-8 Produksjon	Belastningsted Enkel jobbpakke	Jobbpakke C1.BES.229.001 - Arbeider ifbm prov spenningsetting sprinkelanlegg	Godkjent og Bestilt		Lagre bestilling Opprett bestilling Fjern godkjenning Slett rekvisisjon
Rekviert -1 - Admin	Budsjettansvarlig 5994 - KNUt INNGJERDINGEN	Bestiller -1 - Admin	Leverandør		
Betalingsform 2 - Regningsarbeid	Konto 4080 - Viderefakturering utgifter	Rekv.nr. R-170004-00102	Avtale	Lev.Adresse ✖	
Ønsket levert dato 					

Skjermbildet under viser informasjon for en elektronisk bestilling.

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon prosjektkontor

Godkjent

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Leverandør

70000 - ONNINEN AS

Betalingsform

1 - Fastpris

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Rekv.nr.

R-150002-00013

Avtale

OCE_Onninen_6

Lev.Adresse

✉ 167, 0167

Notat

Ønsket levert dato

30.05.2025

Lagre bestilling

Opprett bestilling

Fjern godkjenning

Send bestilling til Symbrio

Prosjekt

150002 - Livsvitensenteret, K401,
Regningsarbeider Statsbyg

Belastningsted

Enkel jobbpakke

Jobbpakke

GK401.1R.001 - Kabling til resepsjon
prosjektkontor

Godkjent

Lagre bestilling

Opprett bestilling

Fjern godkjenning

Send bestilling til Symbrio

Rekvirent

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Budsjettansvarlig

5996 - CHRISTIAN MO

Bestiller

5991 - NINA SPORILD MYRAN

Leverandør

70000 - ONNINEN AS

Betalingsform

1 - Fastpris

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Reky.nr.

R-150002-00013

Avtale

OCE Onninen 6

Ley.Adresse

167,
0167

 Notat

Ønsket levert dato

30.05.2025

Følgende informasjon presenteres, hvor noen av feltene kan endres:

- Prosjekt - Kan ikke endres
- Belastningssted - Kan ikke endres
- Jobbpakke - Kan ikke endres
- Rekvirent - Kan ikke endres
- Budsjetansvarlig - Kan ikke endres
- Bestiller (valg fra rullegardin meny boks)
- Betalingsform (valg fra rullegardin meny boks)
- Konto (valg fra rullegardin meny boks)
- Leverandør (valg fra rullegardin meny boks) – Elektronisk bestilling
- Pris avtale (valg fra rullegardin meny boks) – Elektronisk bestilling
- Leverings adresse – Elektronisk bestilling

- Ønsket levert dato - Oppdaterer alle varelinjene (Ønsket levert dato) med valgt dato

Rekvisisjons endringer lagres ved å aktivere 'Lagre bestilling'.

Det skapes 1 bestilling per leverandør i en manuell bestilling, hvor man angir leverandøren i de enkelte varelinjene.

Funksjonen 'Fjern godkjenning' endrer status på rekvisisjonen slik at den ikke lenger er klar for bestilling. Man må da anvende applikasjonen 'Godkjenning av rekvisisjon' for å klargjøre den for bestilling igjen.

Funksjonen 'Slett rekvisisjon' fjerner rekvisisjonen. Dette kan kun utføres av 'Bestiller'.

Se seksjonen 'Varelinje' under angående forklaring av funksjonen 'Opprett bestilling'.

Ordre bestilling har følgende 2 opsjoner:

- Manuell bestilling
- Elektronisk bestilling via Symbrio

Manuell ordre bestilling

Ved manuell ordre bestilling angir man ikke 'Leverandør' og 'Pris avtale' i detalj bilde.

Etter at man har tastet inn alle relevante data i 'Varelinje' seksjonen kan man aktivere 'Rapport' funksjonen helt øverst til høyre i varelinje bildet.

Systemet skaper følgende rapport (bestillings rekvisisjon (pdf fil)) for rekvisisjonen.

Rekvisisjonssnr.: R-150002-00012				20.05.2025					
Prosjekt	150002	Livsvitensenteret, K401, Regningsarbeider Statsbyg			Jobbpakke	001	Standard		
					PunktNr				
Rekvirent	5991	NINA SPORILD MYRAN			Budsjettansvarlig	- 1	Admin		
Bestiller	5991	NINA SPORILD MYRAN			Konto	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata		
Adresse1	167, 0167, Bygdøy allé 4								
Adresse2									
Varelinje	GProgPost	Enh.	Antall	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Enh. Kost	Total Kost		Avtalt Leveringsdato
1			20	1353103	L-AVGRENING 200MM HV	Kr 20,19	Kr 403,80	30.05.2025	
2			30	0730606	Patchkabel Kat6a 3	Kr 31,50	Kr 945,00	29.05.2025	

Bekreftelse av manuell bestilling håndteres i applikasjonen 'Ordrebekreftelse fra leverandør'.

Elektronisk bestilling via Symbrio

Ved elektronisk bestilling må man angi en leverandør som kan motta bestilling via Symbrio (f.eks Onninen). Videre angir man en gyldig prisavtale samt relatert leverings adresse til leverandøren.

Hvis ikke man spesifiserer leveringsadresse bruker systemet standardadressen.

Videre kan man legge inn et notat til leverandør/transportør.

Etter at prisavtalen er angitt vil kun relaterte artikler presenteres i feltet 'Leverandørs artikkel nummer'. Se 'Varelinje' seksjonen under.

Videre ved valg av artikkel presenteres 'Produsents artikkelnr', 'Beskrivelse', 'Avtalt enhets kost' automatisk.

'Avtalt leveringsdato' estimeres basert på dagens dato + antall leveringsdager for artikkelen som kan endres av bruker.

Dersom en varelinje er markert med et rødt kryss er ikke artikkel registrert i prisavtalen. Dette kan skje dersom artikkel allerede er valgt i en tidligere fase av rekvisisjons prosessen.

Man må spesifisere en gyldig artikkel fra avtalen for at ordren skal kunne bli sendt. I Symbrio må bestiller være registrert med samme ansattnummer som i OneControl.

Etter at alle felt i varelinjene er spesifisert, kan man sende ordre bestillingen via Symbrio til leverandøren ved å aktivere funksjonen 'Send bestilling til Symbrio'. Når ordrebekreftelse er ferdigbehandlet av

leverandør returneres den elektronisk via Symbrio til OneControl. Ordrebekreftelsesdetaljer presenteres i applikasjonen 'Oppfølging av ordre'.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å skape nye varelinjer samt korrigere eksisterende varelinjer (se skjermbildet under). Se også beskrivelse av manuell og elektronisk ordre bestilling i seksjonen 'Detaljer' over.

Varelinje												Rapport
Varelinje	Bok	Verdibærende post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Ønsket levert dato	Leverandør	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Avtalt enh. kost	Enh. pris	Avtalt leveringsdato	
1	▼	▼	1353103 ▼	20	30.05.2025	70000 - ONNINEN AS ▼	1353103	L-AVGRENING 200MM HVIT I	20,10	0,00	10.06.2025	Bestill Slett
2	▼	▼	00181 ▼	30	30.05.2025	▼	00181	Skjøtelenker hvit	30,30	0,00	06.06.2025	Bestill Slett

'Varelinje' seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan editeres:

- Varelinje nummer - Ikke editert
- Bok (valg fra rullegardin meny boks) - Kan utelates.
- Verdibærende post (valg fra rullegardin meny boks) - Kan utelates.

- Leverandørs artikkel nummer (valg fra rullegardin meny boks)
- Denne bestilling (antall)
- Ønsket levert dato
- Leverandør (valg fra rullegardin meny boks)
- Produsents artikkel nummer - Ikke editert
- Beskrivelse hentes automatisk fra valgt artikkel - ikke editert
- Avtalt enhetskost
- Enhetspris - Ikke editert, basert på 'Verdibærende post'
- Avtalt leverings dato

'Avtalt enhetskost' og 'Avtalt leverings dato' presenteres automatisk ved elektronisk bestilling som kan endres av bruker. Når disse to feltene er spesifisert kan man aktivere funksjonen 'Bestill' for en enkelt varelinje.

I 'Detalj' bilde over kan man bestille alle varelinjene (dvs hele rekvisisjonen) ved å aktivere 'Opprett bestilling'. Dette fordrer at man har spesifisert 'Avtalt enhetskost' og 'Avtalt leverings dato' i alle varelinjene for manuell bestilling. Ved elektronisk bestilling anvendes 'Ønsket leveringsdato' og ikke 'Avtalt leverings dato'.

Etter bestilling er utført kan man ikke endre varelinjene.

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' pop up vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av bestilling(varelinjen).

Bekreftelse

Ønsker du å slette denne bestillingen?

✓ Bekreft

⌛ Avbryt

Ordrebekreftelse fra leverandør

Formålet med applikasjonen 'Ordrebekreftelse fra leverandør' er å registrere manuelt ordre bekreftelse av varer fra leverandør. Registrering er basert på ordre bekreftelses dokument fra leverandør.

Ved mottak av ordrebekreftelse fra leverandør bekreftes ønsket leveringsdato og avtalt pris. Ved avvik behandles denne av bestiller i samråd med budsjettansvarlig og rekvirent. Det er da mulig å kansellere varelinjer eller splitte varelinjer i flere delleveranser, dersom dette er hensiktsmessig.

Applikasjonen 'Ordrebekreftelse fra leverandør' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Ved åpning av applikasjonen presenteres rekvisisjoner som ikke er bekreftet.

Se skjermbildet under.

Ordrebekreftelse
fra leverandør

☐ Ferdig levert

Hovedprosjekt

Prosjekt

Leverandør

Rekvirent

Bestiller

Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke	Beløp
70000	ONNINEN AS	B-150021-00004	R-150021-00004	25.10.2022	Rør utvendig Felt 4	Kr 4 354,50
70000	ONNINEN AS	B-150021-00005	R-150021-00005	07.11.2022	Trekke rør i D2M-P1-05 Etappe 4	Kr 1 225,50
70000	ONNINEN AS	B-150021-00006	R-150021-00006	10.11.2022	Trekke rør i D1-P2-05 Etappe 21	Kr 1 080,63
70000	ONNINEN AS	B-150021-00007	R-150021-00007	12.12.2022	Trekke rør i D3-P0-01 Etappe 8	Kr 13 509,42

Detaljer

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon

Jobbpakke

D1P205.411.001 - Trekke rør i D1-P2-05 Etappe 21

Ordrebekreft

Rekvirent

5989 - VASO KUJACIC

Budsjettansvarlig

5989 - VASO KUJACIC

Bestiller

5989 - VASO KUJACIC

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Ordrenr.

B-150021-00006

Varelinje

Bestilling

Rapport

Varelinje	Verdibær, post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Bekreftet enh. kost	Enh. pris	Bekreftet leveringsdato
-----------	----------------	-------------------------	------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------	-------------------------

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Ordrebekreftelse fra leverandør' viser eksisterende utestående rekvisisjoner som ikke er bekreftet samt søke opsjoner
- Midtre del 'Detaljer' presenterer overordnet detaljer av en valgt rekvisisjon fra 'Øvre del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til valgt bestilling(rekvisisjon)

Ved aktivering av en eksisterende 'Rekvisisjons' rad presenteres øvrige data til bestillingen (rekvisisjon) i 'Detaljer' og 'Varelinje' seksjonene.

Ordrebekreftelse fra leverandør (øvre del)

Denne seksjonen brukes til å søk og presentasjon av rekvisisjoner (ordrer som er delvis eller ikke bekreftet). Se skjermbildet under.

Ordrebekreftelse fra leverandør ☐ Ferdig levert							
Hovedprosjekt ▼ Prosjekt ▼ Leverandør ▼ Rekvirent ▼ Bestiller ▼							
Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke		Beløp
70509	NITO	B-150002-00003	R-150002-00015	23.05.2025	Uttak til infoskjermer prosjektkontor	Kr	252,00
70163	ELIT AS	B-150011-00001	R-150011-00001	26.08.2022	Jording-K3Etappe9	Kr	0,00
70163	ELIT AS	B-150012-00001	R-150012-00002	15.02.2023	Etterarbeid Jording Oppstikk og Bolter	Kr	12 435,00
70000	ONNINEN AS	B-150021-00002	R-150021-00001	19.09.2022	Trekke rør i D2N-P1-03 Etappe 1	Kr	2 518,80

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Ferdig levert (avkrysnings boks) Viser rekvisisjoner som er ferdig levert
- Hoved prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)

- Leverandør (valg fra rullegardin meny)
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)

Følgende data presenteres i skjermbildet:

- Leverandør nummer
- Leverandør navn
- PO (purchase order) nummer
- Rekvisisjons nummer
- Rekvisisjons dato
- Jobbpakke
- Beløp

Det er kun manuelle ordre fra leverandør som kan bekreftes i denne applikasjonen.

Elektronisk bekreftede ordrer fra leverandør (via Symbrio) håndteres i applikasjonen 'Oppfølging av ordre'.

Detaljer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å presentasjon av en eksisterende ordre (rekvisisjon). Se skjermbildet under.

Detaljer

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon ▼

Jobbpakke

D2NP103.411.001 - Trekke rør i D2N-P1-03
Etappe 1 ▼

Rekvirent

5989 - VASO KUJACIC ▼

Budsjettansvarlig

5989 - VASO KUJACIC ▼

Bestiller

5989 - VASO KUJACIC ▼

Betalingsform

3 - Mengdebasert ▼

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼

Ordrenr.

B-150021-00002

Ordrebekreft

Følgende data presenteres og kan ikke endres:

- Prosjekt
- Jobbpakke
- Rekvirent
- Budsjettansvarlig
- Bestiller
- Betalingsform
- Konto
- Ordre nummer

Funksjonen 'Ordrebekreft' bekrefter alle varelinjene i ordren som bekreftet. Se 'Varelinje' seksjon under for bekreftelse av de enkelte varelinjene.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen anvendes til å korrigere varelinjene etter mottatt ordre bekreftelse fra leverandør (se skjermbildet under)

Varelinje									Bestilling	Rapport
Varelinje	Verdibær. post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Bekreftet enh. kost	Enh. pris	Bekreftet leveringsdato		
1		8811625	3	8811625	BOR FOR HULLSAG	32,21	0,00	14.11.2022	Endre Delleveranse	
2		1345042	400	1345042	STRIPS SORT T120M 450X7,	1,64	0,00	14.11.2022	Bekreft varelinje Endre Delleveranse Slett	
2.01		1345042	200	1345042	STRIPS SORT T120M 450X7,	1,64	0,00	14.11.2022	Bekreft varelinje Endre Delleveranse Slett	

'Varelinje' seksjonen inneholder følgende data hvor en del av feltene kan endres:

- Varelinje - Kan ikke endres
- Verdibærende post - Kan ikke endres
- Leverandørs artikkel nummer - Kan ikke endres
- Denne bestilling (antall) - Kan ikke endres
- Produsentens artikkel nummer- Kan ikke endres
- Beskrivelse / varetekst - Kan ikke endres
- Bekreftet enhets kost – Endrings bart
- Enhets pris - Kan ikke endres, kommer fra verdibærende post
- Bekreftet leverings dato – Endrings bart

Ved å aktivere funksjonen 'Delleveranse' vil systemet skape en ny varelinje (2.01) hvor man taster inn antall i del leveranse (200) og opprinnelig varelinje (2) justeres automatisk til rest antall (600 endres til 400).

Ved å aktivere funksjonen 'Bekreft varelinje' registreres den som bekreftet samt at opsjonen 'Bekreft varelinje' forsvinner fra varelinjen.

Ved å aktivere funksjonen 'Rapport' helt til høyre skapes følgende 'Ordre Bestillingsnummer' rapport (Formål er å sende en bestilling via epost til leverandør):

Bestillingsnr.: B-150021-00006				10.11.2022					
Leverandør:		70000	ONNINEN AS						
Prosjekt	150021	LVB Rør i dekke - Produksjon		Jobbpakke	D1P205.411.001	Trekke rør i D1-P2-05 Etappe 21			
				PunktNr	5				
Rekvirent	5989	VASO KUJACIC		Budsjettansvarlig	5989	VASO KUJACIC			
Bestiller	5989	VASO KUJACIC		Konto	4000	Innkjøp råvarer og halvfabrikata			
Adresse1									
Adresse2									
Varelinje	GProgPost	Enh.	Antall	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Enh. Kost	Total Kost	Avtalt Leveringsdato	
1			3	8811625	BOR FOR HULLSA	Kr 32,21	Kr 96,63	14.11.2022	
2			400	1345042	STRIPS SORT T120M 45	Kr 1,64	Kr 656,00	14.11.2022	
2.01			200	1345042	STRIPS SORT T120M 45	Kr 1,64	Kr 328,00	14.11.2022	

Forskjellen mellom 'Rapport' og 'Bestilling' er leverings dato.

Ved å aktivere funksjonen 'Endre' åpnes følgende popup-vindu 'Endre bestilling':

Endre bestilling

Leverandørs artikkel nr.

1211103 - R?R RETTE GLATTE EL-
R?R 25MM L

Mengde

Varenummer

Kost

80

1211103

7.65

Beskrivelse/Varetekst

RR RETTE GLATTE EL-RR25MM
LENGDE 4M

✓ Lagre

✗ Avbryt

Nå kan man endre følgende data:

- Leverandørs artikkel nummer
- Mengde
- Varenummer
- Kost
- Beskrivelse/Varetekst

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' pop up vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av bestilling(varelinjen).

Bekreftelse



Ønsker du å slette denne bestillingen?

✓ Bekreft

⊗ Avbryt

Oppfølging av ordre

Formålet med applikasjonen 'Oppfølging av ordre' er å presentere ordrer som enten er bekreftet eller ubekreftet fra leverandør.

Applikasjonen 'Oppfølging av ordre' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Ved åpning av applikasjonen presenteres alle ordrer som er bekreftet / ikke bekreftet av leverandør.

Se skjermbildet under.

Oppfølging av ordre

Ferdig bestilt

Ferdig levert

Bestilling ikke bekreftet

Hovedprosjekt

Prosjekt

Jobbpakke

Rekvirent

Bestiller

Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke	Beløp
70000	ONNINEN AS	B-150021-00015	R-150021-00017	11.05.2023	Trekke rør i D2M-P4-04 Etappe 5	Kr 555,35
70000	ONNINEN AS	B-150021-00016	R-150021-00019	11.05.2023	Trekke rør i D3-P0-05 Etappe 12	Kr 165,21
70000	ONNINEN AS	B-150021-00017	R-150021-00018	11.05.2023	Trekke rør i D2M-P4-06 Etappe 6	Kr 20 093,64
70000	ONNINEN AS	B-150021-00018	R-150021-00020		Trekke rør i D2M-P4-06 Etappe 6	Kr 4 878,00

Detaljer

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon

Jobbpakke

D2MP406.411.001 - Trekke rør i D2M-P4-06 Etappe 6

Rekvirent

5989 - VASO KUJACIC

Budsjettansvarlig

5989 - VASO KUJACIC

Bestiller

90468 - Jannicke Knudsen

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Ordrenr.

B-150021-00017

Bestilling er ikke bekreftet

Varelinje

Rapport

Varelinje	Vordibær, post	Leverandørs artikkelnr	Denne bestilling	Produsents artikkelnr	Beskrivelse / Varetekst	Bekreftet enh. kost	Enh. pris	Ønsket leveringsdato	Avtalt leveringsdato	Bekreftet leveringsdato
-----------	----------------	------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------------

Varelinje	Vordibær, post	Leverandørs artikkelnr	Denne bestilling	Produsents artikkelnr	Beskrivelse / Varetekst	Bekreftet enh. kost	Enh. pris	Ønsket leveringsdato	Avtalt leveringsdato	Bekreftet leveringsdato
-----------	----------------	------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------------

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Oppfølging av ordre' viser alle ordre som er bekreftet/ubekreftet samt tilhørende søke opsjoner
- Midtre del 'Detaljer' presenterer detaljer av en valgt ordre fra 'Øvre del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til en valgt ordre

Ved aktivering av en eksisterende 'Ordre rad' presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Detaljer' og 'Varelinje' seksjonene.

Oppfølging av ordre (øvre del)

Denne seksjonen brukes til å søk og presentasjon av ordrer som enten er bekreftet eller ubekreftet fra leverandør. Se skjermbildet under.

Oppfølging av ordre

☐ Ferdig bestilt ☐ Ferdig levert ☐ Bestilling ikke bekreftet

Hovedprosjekt

▼

Prosjekt

▼

Jobbpakke

▼

Rekvirent

▼

Bestiller

▼

Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke	Beløp
70000	ONNINEN AS	B-150002-00001	R-150002-00002		Kanal på vegg	Kr 2 111,27
70000	ONNINEN AS	B-150002-00002	R-150002-00010		LVB kontor EL montasje	Kr 1 829,00
70000	ONNINEN AS	B-150009-00001	R-150009-00002	10.05.2023	2 - Serverrom	Kr 5 800,00
70000	ONNINEN AS	B-150021-00001	R-150021-00002	19.09.2022	Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2	Kr 55 258,20

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Ferdig bestilt (avkrysnings boks)
- Ferdig levert (avkrysnings boks)

- Bestilling ikke bekreftet (avkrysnings boks)
- Hoved prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Jobbpakke (valg fra rullegardin meny)
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)

Følgende data presenteres:

- Leverandør nummer
- Leverandør navn
- PO (purchase order) nummer
- Rekvisisjons nummer
- Rekvisisjons dato
- Jobbpakke
- Beløp

Detaljer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til presentasjon av en eksisterende ordre (rekvisisjon). Se skjermbildet under.

Detaljer			
Prosjekt 150050 - LVB Gjennomføring - Felt 4-6 Produksjon	Jobbpakke K432.41x.030 - Kanal på vegg	Bestilling er bekreftet	
Rekvirent 90533 - Kristoffer Knutsmoen	Budsjettansvarlig 6368 - ROGER KARLSEN	Bestiller 90468 - Jannicke Knudsen	
Betalingsform 3 - Mengdebasert	Konto 4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata	Ordrenr. B-150050-00546	BestillingsID - Lev.OrdreNr. 13161608-35756385

Følgende data presenteres og kan ikke endres:

- Prosjekt
- Jobbpakke
- Rekvirent
- Budsjettsansvarlig
- Bestiller
- Betalingsform
- Konto
- Ordre nummer
- BestillingsID – Lev.OrdreNR. (bestillingsID i Symbrio, er også søkbart i Symbrio, samt leverandørens ordrenummer)

Videre presenteres tekst til høyre i bildet som indikerer om 'Bestilling er bekreftet' eller 'Bestilling ikke bekreftet'.

Elektronisk bekreftede ordrer (via Symbrio) presenteres her og kommer ikke frem i applikasjonen 'Ordre bekreftelse fra leverandør'. Hvis ikke ordren er bekreftet vises den i "Ordre bekreftelse fra leverandør" samt når det er en rest på bestilling.

Varelinje (nedre del)

I denne seksjonen kan man ikke endre varelinjer når ordren er bekreftet (se skjermbildet under)

Er ordren ubekreftet kan man endre varelinjer ved hjelp av 'Endre' funksjonen (se skjermbildet under).

Varelinjene markert som 'grønn' er ikke editert, da det er utført varemottak av disse.

Varelinje											Rapport
Varelinje	Verdibær. post	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Bekreftet enh. kost	Enh. pris	Ønsket leveringsdato	Avtalt leveringsdato	Bekreftet leveringsdato	
1		1211103	60	121114	RR RETTE GLATTE EL-RR25	7,65	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	
1.01		1211103	20	121114	RR RETTE GLATTE EL-RR25	7,65	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	
2		1215796	20	1215796	RRUTSPARING PLAST 25MM	13,29	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	
2.01		1215796	1	1215796	RRUTSPARING PLAST 25MM	13,29	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	
2.02		1215796	19	1215796	RRUTSPARING PLAST 25MM	13,29	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	Endre Delleveranse Slett
3		1214006	40	1214006	NORMALBEND 25MM PLAST	34,38	0,00	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	Endre Delleveranse Slett

Her er et eksempel hvor varelinjene 1, 1.01, 2 og 2.01 er bekreftet samt varemottak utført. Varelinjene 2.02 er bekreftet. Varelinje 3 er ubekreftet.

Ved å aktivere funksjonen 'Delleveranse' skaper systemet en ny varelinje (her 1.01, 2.01, 2.02) hvor man angir del leveranse antall. Varelinje (f.eks 1) reduseres med angitt antall i del leveranse varelinje.

'Varelinje' seksjonen inneholder følgende data:

- Varelinje
- Verdibærende post
- Leverandørs artikkel nummer
- Denne bestilling
- Produsentens artikkel nummer
- Beskrivelse / Varetekst
- Bekreftet enhets kost
- Enhets pris
- Ønsket leverings dato
- Avtalt leveringsdato
- Bekreftet leverings dato

Ved å aktivere funksjonen 'Endre' åpnes følgende pop up vindu 'Endre bestilling':

Endre bestilling

Leverandørs artikkel nr.

1211103 - R?R RETTE GLATTE EL-
R?R 25MM L

Mengde

Varenummer

Kost

80

1211103

7.65

Beskrivelse/Varetekst

RR RETTE GLATTE EL-RR25MM
LENGDE 4M

✓ Lagre

✗ Avbryt

Nå kan man endre følgende data:

- Leverandørs artikkel nummer
- Mengde
- Varenummer
- Kost
- Beskrivelse/Varetekst

Ved å aktivere funksjonen 'Rapport' (øverst til høyre). Skapes 'Bestillings nummer' rapporten som vist under.

Bestillingsnr.: B-150021-00021					28.08.2023						
Leverandør:		70000		ONNINEN AS							
Prosjekt	150021		LVB Rør i dekke - Produksjon		Jobbpakke	D1P307.411.001		Trekke rør i D1-P3-07 Etappe 23			
							PunktNr	55			
Rekvirent	5989		VASO KUJACIC				Budsjettansvarlig	5989		VASO KUJACIC	
Bestiller	90468		Jannicke Knudsen				Konto	4000		Innkjøp råvarer og halvfabrikata	
Adresse1											
Adresse2											
Varelinje	GProgPost	Enh.	Antall	Produsents artikkelnr.	Beskrivelse / Varetekst	Enh. Kost	Total Kost	Ønsket Leveringsdato	Avtalt Leveringsdato	Bekreftet Leveringsdato	
1			10	1356070	TAKPENDEL 2/1000.FZ	Kr 104,37	Kr 1043,70	29.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	
2			5	1335409	ONNLINE EKSP.BOLT ST	Kr 102,93	Kr 514,65	29.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	

Ved aktivering av 'Slett' knapp helt til høyre i varelinje seksjonen aktiveres følgende 'bekreftelses' popup-vindu. Hvor man kan bekrefte sletting av bestilling(varelinjen).

Bekreftelse



Ønsker du å slette denne bestillingen?

✓ Bekreft

⊗ Avbryt

Fakturakontroll

Formålet med applikasjonen 'Fakturakontroll' er å kontrollere fakturerte varelinjer i forhold til mottatt materiell og bestilte enhetspriser.

Ved avvik skal disse avklares med leverandør før noen deler av faktura kan godkjennes.

'Fakturakontroll' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Ved åpning av applikasjonen presenteres alle godkjente ordrer og ikke godkjente (fakturaer).

Se skjermbildet under.

Fakturakontroll



Ferdig levert

1600020 - Livsvitensenteret ▼

Prosjekt ▼

Leverandør ▼

Rekvirent ▼

Bestiller ▼

Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke	Beløp
70000	ONNINEN AS	B-150002-00001	R-150002-00002		Kanal på vegg	Kr 2 111,27
70000	ONNINEN AS	B-150002-00002	R-150002-00010		LVB kontor EL montasje	Kr 1 829,00
70000	ONNINEN AS	B-150009-00001	R-150009-00002	10.05.2023	2 - Serverrom	Kr 5 800,00
70000	ONNINEN AS	B-150021-00001	R-150021-00002	19.09.2022	Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2	Kr 55 258,20

Detaljer

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon ▼

Jobbpakke

D2MP106.411.001 - Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2 ▼

Rekvirent

5989 - VASO KUJACIC ▼

Budsjettansvarlig

5989 - VASO KUJACIC ▼

Bestiller

5989 - VASO KUJACIC ▼

Faktura godkjent

Godkjenn

Betalingsform

3 - Mengdebasert ▼

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼

Ordrenr.

B-150021-00001

Sum Total pris

55258.2

Varelinje

Varelinje	Lev./prod. artikkel	Beskrivelse/varetekst	Enhet	Bestilt antall	Lvert antall	Rest antall	Enhets pris	Total pris	Mottatt levert dato
1	0050105	Kabel 125 - 2		540	0	540	89.40	47500.0	20.09.2023

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Fakturakontroll' viser alle ordrer som er som er godkjente og ikke godkjente (fakturaer) med tilhørende søke opsjoner
- Midtre del 'Detaljer' presenterer detaljer av en valgt ordre fra 'Øvre del'
- Nedre del 'Varelinje' viser de enkelte varelinjene til en valgt ordre (faktura)

Ved aktivering av en eksisterende 'Ordre rad' presenteres øvrige data til rekvisisjonen i 'Detaljer' og 'Varelinje' seksjonen.

Fakturakontroll (øverste del)

Denne seksjonen brukes til å søk og presentasjon av ordrer hvor faktura ikke er godkjente eller godkjente. Videre en applikasjon for scanning av Se skjermbildet under.

Fakturakontroll ☐ Ferdig levert						
1600020 - Livsvitensenteret		Prosjekt	Leverandør	Rekvirent	Bestiller	
Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke	Beløp
70000	ONNINEN AS	B-150002-00001	R-150002-00002		Kanal på vegg	Kr 2 111,27
70000	ONNINEN AS	B-150002-00002	R-150002-00010		LVB kontor EL montasje	Kr 1 829,00
70000	ONNINEN AS	B-150009-00001	R-150009-00002	10.05.2023	2 - Serverrom	Kr 5 800,00
70000	ONNINEN AS	B-150021-00001	R-150021-00002	19.09.2022	Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2	Kr 55 258,20

Følgende søke opsjoner er tilgjengelig:

- Ferdig levert
- Hoved prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Prosjekt (valg fra rullegardin meny)
- Leverandør (valg fra rullegardin meny)
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)
- Bestiller (valg fra rullegardin meny)

Følgende data presenteres i skjermbildet:

- Leverandør nummer
- Leverandør navn
- PO (purchase order) nummer
- Rekvisisjons nummer
- Rekvisisjons dato
- Jobbpakke
- Beløp

Detaljer (midtre del)

Denne seksjonen brukes til å presentasjon av en eksisterende ordre (faktura). Se skjermbildet under.

Detaljer			
Prosjekt 150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon ▼	Jobbpakke D2MP106.411.001 - Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2 ▼		
Rekvirent 5989 - VASO KUJACIC ▼	Budsjettansvarlig 5989 - VASO KUJACIC ▼	Bestiller 5989 - VASO KUJACIC ▼	Faktura godkjent Godkjenn
Betalingsform 3 - Mengdebasert ▼	Konto 4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼	Ordrenr. B-150021-00001	Sum Total pris 55258.2

Følgende data presenteres og kan ikke endres:

- Prosjekt
- Jobbpakke
- Rekvirent
- Budsjettansvarlig
- Bestiller
- Betalingsform
- Konto
- Ordre nummer
- Sum total pris (alle varelinjer)

Funksjonen 'Faktura godkjent' brukes til å godkjenne fakturaen. Teksten 'Godkjenn' endrer seg til 'Faktura godkjent' ved aktivering av denne funksjonen.

Varelinje (nedre del)

Denne seksjonen viser de enkelte varelinjene til en ordre (faktura). (se skjermbildet under)

Varelinje									
Varelinje	Lev./prod. artikkel	Beskrivelse/varetekst	Enhet	Bestilt antall	Lvert antall	Rest antall	Enhets pris	Total pris	Motatt levert dato
1	2859105	Kabelrør 125mm 6m		540	0	540	88.13	47590.2	26.09.2022
2	2860193	Endelokk Rør 125mm		100	0	100	7.72	772	26.09.2022
3	2862629	Gjennomføringsmuffe 125mm		1	1	0	68.96	68.96	26.09.2022
3.01	2862629	Gjennomføringsmuffe 125mm		99	0	99	68.96	6827.04	26.09.2022

‘Varelinje’ seksjonen inneholder følgende data og kan ikke endres:

- Varelinje
- Verd
- Leverandørs /produsentens artikkel nummer
- Beskrivelse / varetekst
- Enhet
- Bestilt antall
- Rest antall
- Enhets pris
- Total pris
- Mottatt levert dato

Mottak av varer

Formålet med 'Mottak av varer' er å registrere varemottak iht pakkseddel fra transportør. Etter signert pakkseddel skal varemottaket registreres. Registrering av varemottak kan også utføres ved hjelp av å skanne varer ved hjelp av en WebApp mobil applikasjon. Se detaljer under.

Applikasjonen 'Mottak av varer' finner man i menyen under 'Innkjøp/Logistikk'. Se skjermbildet under.

Mottak av varer

■ Bestilling bekreftet

Prosjekt

Leverandør

Rekvirent

Bestiller

PO-nr

Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke
70000	ONNINEN AS	B-150002-00001	R-150002-00002	13.09.2021	Kanal på vegg
70000	ONNINEN AS	B-150021-00001	R-150021-00002	19.09.2022	Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2
70000	ONNINEN AS	B-150021-00002	R-150021-00001	19.09.2022	Trekke rør i D2N-P1-03 Etappe 1
70000	ONNINEN AS	B-150021-00006	R-150021-00006	10.11.2022	Trekke rør i D1-P2-05 Etappe 21

Detaljer

Prosjekt

150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon

Jobbpakke

D2MP106.411.001 - Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2

Rekvirent

5989 - VASO KUJACIC

Budsjettansvarlig

5989 - VASO KUJACIC

Bestiller

5989 - VASO KUJACIC

Betalingsform

3 - Mengdebasert

Konto

4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata

Ordrenr.

B-150021-00001

Varelinje													Endre flere
Varelinje	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Lvert antall	Rest antall	Produsents artikkelnr.	Bekreftet leveringsdato	Beskrivelse / Varetekst	Lagersted	Leveringsdato	Mottatt	Kolonne	Hylle	
1	2859105	540	0	540	2835605	26.09.2022	Kabelrør 125mm 6m		30.5.2025	540	1	1	Retur
2	2860193	1	1	1	2860193		Endelokk Rør 125mm	ML	28.05.2025				
2.01	2860193	99	0	99	2860193		Endelokk Rør 125mm		30.5.2025	99	1	4	Retur
3	2862629	1	1	1	2862629		Gjennomføringsmuffe 125mm	DL	26.05.2025		1	1	
3.01	2862629	99	0	99	2862629		Gjennomføringsmuffe 125mm		30.5.2025	99			Retur

Denne har følgende 3 seksjoner:

- Øvre del 'Mottak av varer' viser alle rekvisisjonene som har utestående varer for levering samt søke opsjoner
- Midtre del 'Detaljer' viser detaljer av rekvisisjonen
- Nedre del 'Varelinje' viser varelinjene til en valgt rekvisisjon

Mottak av varer (øvre del)

'Mottak av varer' viser alle utestående rekvisisjoner hvor man ikke har mottatt artiklene til et lager fra en leverandør samt en søkedel.

Mottak av varer					
☐ Bestilling bekreftet		Prosjekt ▼	Leverandør ▼	Rekvirent ▼	Bestiller ▼
		PO-nr ▼			
Leverandør nr.	Leverandørnavn	PO-nr.	Rekvisisjons nr.	Rekv.dato	Jobbpakke
70000	ONNINEN AS	B-150002-00001	R-150002-00002	13.09.2021	Kanal på vegg
70000	ONNINEN AS	B-150009-00001	R-150009-00002	10.05.2023	2 - Serverrom
70000	ONNINEN AS	B-150021-00001	R-150021-00002	19.09.2022	Trekke rør i D2M-P1-06 Etappe 2
70000	ONNINEN AS	B-150021-00002	R-150021-00001	19.09.2022	Trekke rør i D2N-P1-03 Etappe 1

Søke delen har følgende opsjoner:

- Bestilling bekreftet
- Prosjekt nummer (valg fra rullegardin meny)
- Leverandør (valg fra rullegardin meny)
- Rekvirent (valg fra rullegardin meny)

- Bestiller (valg fra rullegardin meny)
- PO-nr (Purchase order number), (valg fra rullegardin meny)

Under søkedelen lister man rekvisisjoner som kvalifiser for angitt søk og har følgende informasjon:

- Leverandør nummer
- Leverandør navn
- Purchase order nummer (PO-nr)
- Rekvisisjons nummer
- Rekvisisjons dato
- Jobbpakke

Ved å 'klikke' på en av Rekvisisjonene presenteres rekvisisjons data i 'Detaljer' og 'Varelinje' seksjonene.

Detaljer (midtre del)

Detaljer		
Prosjekt 150021 - LVB Rør i dekke - Produksjon ▼	Jobbpakke D2NP103.411.001 - Trekke rør i D2N-P1-03 Etappe 1 ▼	
Rekvirent 5989 - VASO KUJACIC ▼	Budsjettansvarlig 5989 - VASO KUJACIC ▼	Bestiller 5989 - VASO KUJACIC ▼
Betalingsform 3 - Mengdebasert ▼	Konto 4000 - Innkjøp råvarer og halvfabrikata ▼	Ordrenr. B-150021-00002

Under 'Detaljer' vises følgende informasjon (kan ikke endres):

- Prosjekt nummer
- Jobbpakke
- Rekvirent
- Budsjettansvarlig
- Bestiller
- Betalingsform
- Konto
- Ordre nummer

Varelinjer (nederste del)

Varelinje													Endre flere
Varelinje	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Lvert antall	Rest antall	Produsents artikkelnr.	Bekreftet leveringsdato	Beskrivelse / Varetekst	Lagersted	Leveringsdato	Mottatt	Kolonne	Hylle	
1	1211103	80	0	80	121114	20.09.2022	RR RETTE GLATTE EL-RR25MM LENGDE 4M	▼	26.5.2025	80			Retur
2	1215796	40	0	40	1215796	20.09.2022	RRUTSPARING PLAST 25MM	▼	26.5.2025	40			Retur

Varelinje seksjonen viser følgende informasjon:

- Varelinje – Ikke endrings bart
- Leverandørs artikkel nummer– Ikke endrings bart
- Denne bestilling (antall) – Ikke endrings bart
- Lvert antall– Ikke endrings bart

- Rest antall (gjenstående antall) – Ikke endrings bart
- Produsentens artikkel nummer– Ikke endrings bart
- Bekreftet leverings dato– Ikke endrings bart
- Beskrivelse / Varetekst– Ikke endrings bart
- Lagersted (valg fra rullegardin meny boks)
- Leveringsdato– Ikke endrings bart
- Mottatt (angir antall som mottas) se tekst under
- Kolonne, angir hvilken kolonne i lager som velges fra rullegardin meny boks (dersom lager er definert med kolonne)
- Hylle, angir hvilken hylle i lager som velges fra rullegardin meny boks (dersom lager er definert med hylle)

Ved å angi 'Lagersted' aktiveres funksjonen 'Mottatt' (helt til høyre på varelinje raden). Se Varelinje bilde under.

Man kan nå angi antall som skal mottas under kolonnen 'Mottatt', hvor man enten spesifiserer total bestilt kvantum eller deler av bestilt kvantum. Se varelinje under.

Deretter aktiveres 'Mottatt' som resulterer i følgende bekreftelses bilde:

Bekreftelse

Markere som mottatt?

✓ Bekreft

⚙ Avbryt

I skjermbildet under er antall (mottatt) endret i varelinje 1 fra 30 til 10. Dette resulterer i en ny varelinje (1.01) med antall 10 og varelinje 1 endret fra 30 til 20.

Varelinje 2 har mottatt bestilt antall 30. Varelinje 3 og 4 er uendret (ikke mottatt).

Varelinje													Endre flere
Varelinje	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Lvert antall	Rest antall	Produsents artikkelnr.	Bekreftet leveringsdato	Beskrivelse / Varetekst	Lagersted	Leveringsdato	Mottatt	Kolonne	Hylle	
1	1215796	20	20	20	1215796	25.05.2023	RRUTSPARING PLAST 25MM	ML▼	27.05.2025				
1.01	1215796	10	0	10	1215796	25.05.2023	RRUTSPARING PLAST 25MM	▼	27.5.2025	10			Retur
2	1216456	30	30	30	1216456	25.05.2023	GJENNOMFRINGSMUFFE RD 32MM	ML▼	27.05.2025				
3	1214006	30	0	30	1214006	25.05.2023	NORMALBEND 25MM PLAST	ML▼	27.5.2025	30			Mottatt Retur
4	1214007	30	0	30	1214007	25.05.2023	NORMALBEND PLAST 32MM	ML▼	27.5.2025	30			Mottatt Retur

Ved å aktivere opsjonen 'Endre flere' (øverst til høyre) endres skjermbildet som vist under. Nå kan man 'Motta alle' varelinjene ved å angi 'Lagersted' (øverste rad)

samt tilhørende 'Kolonne' og 'Hylle', hvis lager er definert med 'Kolonne' og 'Hylle'.

Varelinje													Endre flere
Varelinje	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Lever tall	Rest tall	Produsents artikkelnr.	Bekreftet leveringsdato	Beskrivelse / Varetekst	Lagersted	Leveringsdato	Mottatt	Kolonne	Hylle	
								DL▼	16.1.2025				Motta alle
1	1211103	80	0	80	1211103	20.09.2022	RR RETTE GLATTE EL-RR25MM LENGDE 4M	DL▼	16.1.2025	80			Mottatt Retur
2	1215796	40	0	40	1215796	20.09.2022	RRUTSPARING PLAST 25MM	DL▼	16.1.2025	40			Mottatt Retur


Opsjonen 'Retur' (helt til høyre på varelinje raden) gir mulighet til å returnere varene. Ved 'retur' skapes en ny varelinje (rød) som vist i bildet under. Varelinje 1.01,

returnert antall = 120, varelinje1 justert til 420(opprinnelig 540).


Varelinje													Endre flere
Varelinje	Leverandørs artikkelnr.	Denne bestilling	Lvert antall	Rest antall	Produsents artikkelnr.	Bekreftet leveringsdato	Beskrivelse / Varetekst	Lagersted	Leveringsdato	Mottatt	Kolonne	Hylle	
1	2859105	420	0	420	2835605	26.09.2022	Kabelrør 125mm 6m	▼	17.1.2025	420	1	1	Retur
1.01	2859105	120	0	120	2835605	26.09.2022	Kabelrør 125mm 6m	▼	17.1.2025	Returert			
2	2860193	100	0	100	2860193		Endelokk Rør 125mm	▼	17.1.2025	100			Retur
3	2862629	100	0	100	2862629		Gjennomføringsmuffe 125mm	▼	17.1.2025	100			Retur

Scanning av varer med WebApp på mobil


Velg Kvittere mottak fra Hamburgermenyen øverst i høyre hjørne

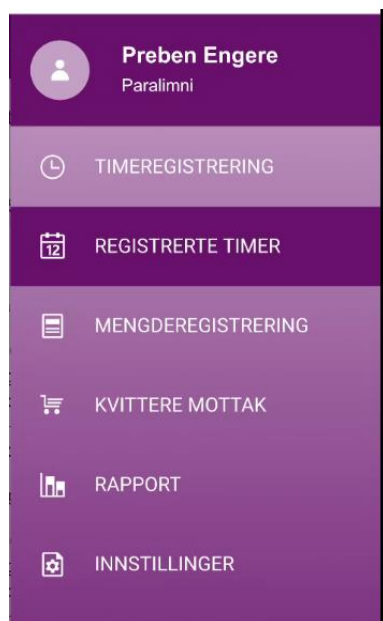

Du får da opp oversikt over aktuelle prosjekter for mottak, og kan gjøre manuelt mottak, men det aktuelle valget her vil være å velge «Skann pakkseddel»

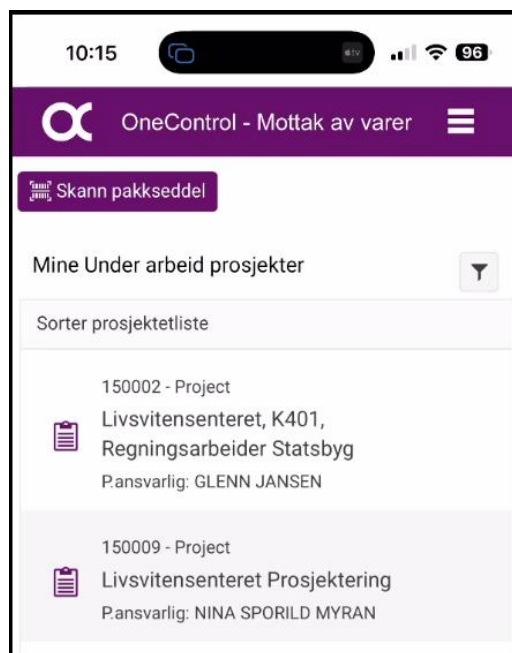

Du får da opp dette skjermbilde, hvor du ved første gangs bruk av applikasjonen må velge hvilket kamera som skal benyttes. Dersom du har en iphone 26 pro max, vil du ha flere valg for kameraet bak, og best resultat får du ved å velge Ultravidvinkelkamera bak. Her må man prøve seg frem inntil man finner det kameraet som gir raskest treff på qr-koden som skal skannes. Valgt kamera huskes til neste gangs bruk.

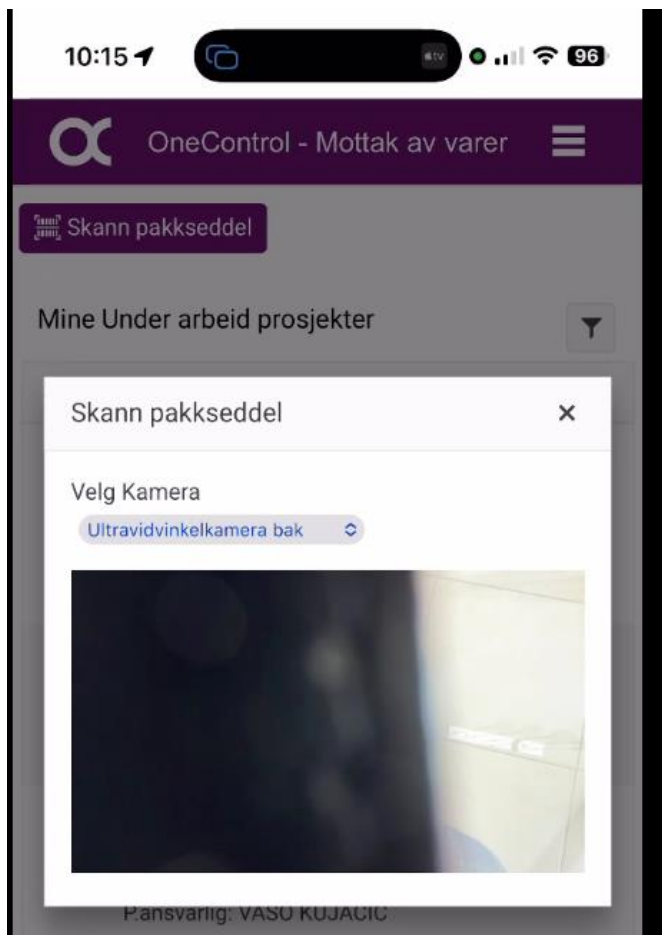

Deretter gjør du en skanning av aktuell QR kode fra ONNINEN – som pr nå er den eneste leverandøren som vi har bygget inn qr-kode skanning for, og dersom pakkseddelen refererer til en bestilling som er gjort gjennom OneControl vil aktuell bestilling åpne seg. Dersom andre leverandører er aktuelle, eller annet format enn QR – som strekkode, så må dette utvikles for hver leverandør, dersom de ikke følger et standard oppsett.

Skanningen gir deg denne visningen av bestillingen:

70000 - ONNINEN AS	
B-150050-00909	R-150050-00993
10.02.2025	Lindinvent, generelt

1550576	Bestilt:100
771-001/K360-0754/000-1300	Lever:0
Leveringsdato:	Rest:100
Mottatt antall:	0

1550577	Bestilt:100
771-001/K360-0754/000-1400	Lever:0
Leveringsdato:	Rest:100
Mottatt antall:	0

1550578	Bestilt:100
771-001/K360-0754/000-2000	Lever:0
Leveringsdato:	Rest:100
Mottatt antall:	0

1550579	Bestilt:100
771-001/K360-0754/000-2100	Lever:0
Leveringsdato:	Rest:100
Mottatt antall:	0

771-099/K000-0219	Bestilt:100
-------------------	-------------

Linjer fra bestillingen som har antall i bekreftelsen vises øverst i skjermbildet, og antall Levert viser antallet fra pakkseddelen. Kontroller mot faktiske varer levert, evt korreger, og skroll ned til slutten av bestillingen og bruk menyvalget «Meld mottak».

«Meld mottak alt» benyttes dersom du ønsker å kvittere hele bestillingen som mottatt.

Mottatt antall:	0
-----------------	---

 Skann pakkseddel	✓ Meld mottak
⌵ Meld mottak alt	

For å skanne en ny pakkseddel trykker du på Skann pakkseddel her, eller går tilbake til hovedmenyen.
